


Aktennotiz Besprechung Chanofsky Schlössle 14 – 15 Uhr

Teilnehmer:

Herr BM Natter, Gde Langenbrettach
 Herr Laufer, Schneider Bau HN
 Herr Pauly, Schneider Bau HN
 Frau Chiara Bux, Praktikantin Schneider Bau HN
 Herr Niemann, Schlosser Waffenschmid
 Herr Thomas Sander, Berufsschullehrer für Bautechnik an der Johann-Jakob-Widmann
 Schule in Heilbronn,
 Frau Christine Köhler, Verein Jugend und Arbeit
 Frau Doris Köhler, Verein Jugend und Arbeit

Leistung Herr Sander:

Treppeneingang mit Holz-Schräge ist hergestellt
 Herstellung der Treppe in Berufsschule
 Montage auf Fundamenten in Keller
 Fertigstellung Pflaster wenn Treppe montiert

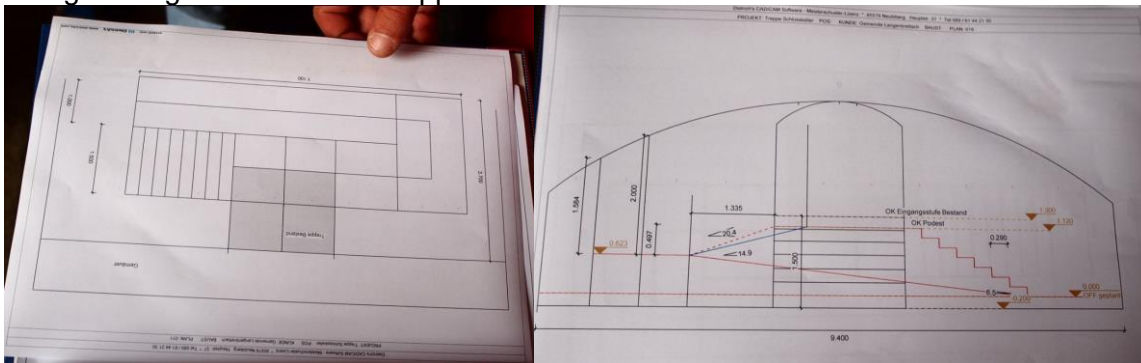

Leistung Schneider Bau

Pflaster: Ausführung Betonpflaster / Bemusterung durch Schneider Bau / Stärke 6 cm /
 Muster antik
 Splitt ca 18 to / Schubkarren im Keller verteilen
 Große Vertiefungen mit Einkorn-Beton vorher auffüttern (Rinne in Raummitte, Versatz ca 7
 cm neben Betonflächen etc.)
 Verdichtung Pflasterfläche durch Rüttelplatte (ca 150kg) – keine Gewähr für Risse im
 Gewölbe o.ä.



Verbrennungsmotor: ACHTUNG Luftzuführung – evtl. Einsatzübung Feuerwehr mit
 Entraucher??

Jugend & Arbeit e.V.

Steinsfeldle 16 * 74613 Öhringen
 Tel 07941 9126 0 * Fax 07941 9126 89
 Sparkasse Hohenlohe * BLZ 622 515 50 * Kto 220 018 645
 VR 415, Amtsgericht Öhringen
 Steuer Nr. 76001/38924, Finanzamt Öhringen

Entwässerung:

Kleiner Schacht neben Treppe rückbauen / Eternit-Rohr
(Baujahr ca 1960) ersetzen durch KG Rohr (Überlauf)

„Tropf-Höhle“ Drainagerohr fassen – entlang Kellergewölbe führen und in Schacht bei Treppe
einleiten

Fundament Treppe – z.T. aufgesetzt
Notfalltreppe evtl. Podest wegnehmen

Leistung Waffenschmid

Stahl-Winkel ca 7-8 cm hoch, Innenschenkel 6 cm, Löcher vorgebohrt

Montage durch Azubis Schneider Bau, Schüler-/innen Gehörlosenschule –Unterstützung
durch Herrn Niemann vor Ort

Material Bestellung / Kosten über Fa. Waffenschmid

Anschluss zum Kellergewölbe durch Grobschotterstreifen / Lochblech anstellen – dadurch
Entwässerung im Splittbett ggf. möglich – Anschluss Drainage

Während Ausführung ist halbseitige Sperrung für einige Tage möglich (Antransport Material)
Nutzung Fläche vor Keller als Lagerfläche möglich – Boden-Strahler abdecken

Elektriker wg. Verlegung Erdkabel fragen?
Notbeleuchtung – Notbeschilderung etc.

Ausführungszeit:

Ausführung: wenn Azubis in Betriebseinsatz – noch unklar wegen Blockunterricht
Berufsschule / ÜBA – vorauss. Oktober 2017

Lindenparkschule Heilbronn – Das Lehrerehepaar Wagner wird das Projekt begleiten. Die
Schüler sind auf Realschulniveau und in der 8. oder 9. Klasse. Wir haben drei
Doppelstunden vorgesehen, in denen wir mit 16 Schülerinnen (wesentlich mehr Jungs)
Berechnungen anstellen und Fachkunde vermitteln wollen. Da wäre es gut, wenn wir
Straßenbauer Azubis (und Christine) dabei hätten. Herr Wagner ist auch Mathe-Lehrer. Das
könnte im Oktober sein. Für den praktischen Ausbau sind wir von 3 ganzen,
zusammenhängenden Tagen ausgegangen. Die Schule hat eine Küche. Die könnte die
Verpflegung übernehmen. Die Kosten dafür (Materialien) könnte der Verein tragen.

Gewährleistung / Garantie für die Arbeiten kann von keinem Ausführenden übernommen werden

Bei den Arbeiten handelt es sich nicht um einen Eingriff in die Denkmalsubstanz. Alle
Einbauten sind reversibel.

03.08.2017 / Doris Köhler

Jugend & Arbeit e.V.

Steinsfeldle 16 * 74613 Öhringen

Tel 07941 9126 0 * Fax 07941 9126 89

Sparkasse Hohenlohe * BLZ 622 515 50 * Kto 220 018 645

VR 415, Amtsgericht Öhringen

Steuer Nr. 76001/38924, Finanzamt Öhringen
